

COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di Lecce

ADEGUAMENTO DEGLI SCARICHI E DELLE IMMISSIONI NEL SOTTOSUOLO DELLE ACQUE METEORICHE

- PROGETTO ESECUTIVO -

5					
4					
3					
2					
1					
0	Aprile 2010	WStrafella	MBarbara	PStasi	Prima Emissione
Em./Rev	Data	Red./Dis.	Verificato	Approvato	Descrizione
Redazione grafica: ETACONS S.r.l. - P.tta S. G. dei Fiorentini n.1 - 73100 LECCE Tel(0832)331418/7 Fax(0832)331486 E-mail: mail@etacons.it					Cod. N°: E201-E
<u>Titolo dell'allegato</u> CRONOPROGRAMMA					<u>Allegato n.</u> L
					<u>Scala</u>
<u>Progettazione:</u>  ETACONS S.r.l. Società di ingegneria -Ing. Primo Stasi Arch. Angelo Colletta			<u>Committente:</u> COMUNE DI SALICE SALENTINO		

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI

PROGRAMMA DEI LAVORI

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 01/07/2010 a 05/09/2010	da 06/09/2010 a 11/10/2010	da 12/10/2010 a 16/11/2010	da 17/11/2010 a 22/12/2010	da 23/12/2010 a 27/01/2011	da 28/01/2011 a 18/02/2011
0 - INCANTIERAMENTO							
1 - MOVIMENTI DI MATERIE	€ 302.451,15	€ 32.078,15	€ 32.994,67	€ 32.994,67	€ 32.994,67	€ 32.994,67	€ 20.163,41
2 - CONDOTTE A GRAVITA'	€ 464.147,87						€ 69.464,31
3 - RIPRISTINI STRADALI	€ 47.515,65						
4 - OPERE D'ARTE	€ 896.924,57	€ 131.057,47	€ 147.439,66	€ 147.439,66	€ 147.439,66	€ 147.439,66	€ 90.102,01
5 - VARIE	€ 142.811,34	€ 18.134,77					
6 - CADITOIE	€ 45.862,72						
IMPORTO		€ 181.270,39	€ 180.434,33	€ 180.434,33	€ 180.434,33	€ 180.434,33	€ 179.729,73
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 181.270,39	€ 361.704,72	€ 542.139,05	€ 722.573,38	€ 903.007,71	€ 1.082.737,44
%		9,54%	9,50%	9,50%	9,50%	9,50%	9,46%
% PROGRESSIVA		9,54%	19,04%	28,54%	38,04%	47,53%	56,99%

PROGRAMMA DEI LAVORI							
DESCRIZIONE	ricavi	da 19/02/2011 a 13/03/2011	da 14/03/2011 a 15/04/2011	da 16/04/2011 a 14/05/2011	da 15/05/2011 a 12/06/2011	da 13/06/2011 a 07/07/2011	
0 - INCANTIERAMENTO							
1 - MOVIMENTI DI MATERIE	€ 302.451,15	€ 21.079,93	€ 30.245,12	€ 26.579,04	€ 26.579,04	€ 13.747,78	
2 - CONDOTTE A GRAVITA'	€ 464.147,87	€ 72.621,78	€ 104.196,46	€ 91.566,59	€ 91.566,59	€ 34.732,14	
3 - RIPRISTINI STRADALI	€ 47.515,65		€ 11.180,15		€ 16.770,23	€ 19.565,27	
4 - OPERE D'ARTE	€ 896.924,57	€ 86.006,45					
5 - VARIE	€ 142.811,34		€ 34.002,70	€ 65.738,55	€ 24.935,32		
6 - CADITOIE	€ 45.862,72				€ 15.724,36	€ 30.138,36	
IMPORTO		€ 179.708,16	€ 179.624,43	€ 183.884,18	€ 175.575,54	€ 98.183,55	
IMPORTO PROGRESSIVO		€ 1.262.445,60	€ 1.442.070,03	€ 1.625.954,21	€ 1.801.529,75	€ 1.899.713,30	
%		9,46%	9,46%	9,68%	9,24%	5,17%	
% PROGRESSIVA		66,45%	75,91%	85,59%	94,83%	100,00%	


PROGRAMMAZIONE S.A.L.

PROGRAMMA S.A.L.

DATA	GIORNI PROGRESSIVI	GIORNI PERIODO	IMPORTO LAVORI PROGRESSIVO	IMPORTO LAVORI PERIODO	% PROGRESSIVA	SAL PROGRAMMATO
01/07/2010	0	0	€ 0,00	€ 0,00	0,00	Inizio lavori
05/09/2010	67	67	€ 181.270,39	€ 181.270,39	9,54	Si
11/10/2010	103	36	€ 361.704,72	€ 180.434,33	19,04	Si
16/11/2010	139	36	€ 542.139,05	€ 180.434,33	28,54	Si
22/12/2010	175	36	€ 722.573,38	€ 180.434,33	38,04	Si
27/01/2011	211	36	€ 903.007,70	€ 180.434,32	47,53	Si
18/02/2011	233	22	€ 1.082.737,43	€ 179.729,73	56,99	Si
13/03/2011	256	23	€ 1.262.445,61	€ 179.708,18	66,45	Si
15/04/2011	289	33	€ 1.442.070,03	€ 179.624,42	75,91	Si
14/05/2011	318	29	€ 1.625.954,22	€ 183.884,19	85,59	Si
12/06/2011	347	29	€ 1.801.529,75	€ 175.575,53	94,83	Si
07/07/2011	372	25	€ 1.899.713,30	€ 98.183,55	100,00	Si

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 372 (trecentosettantadue) giorni naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

DIAGRAMMA SAL PROGRAMMATI

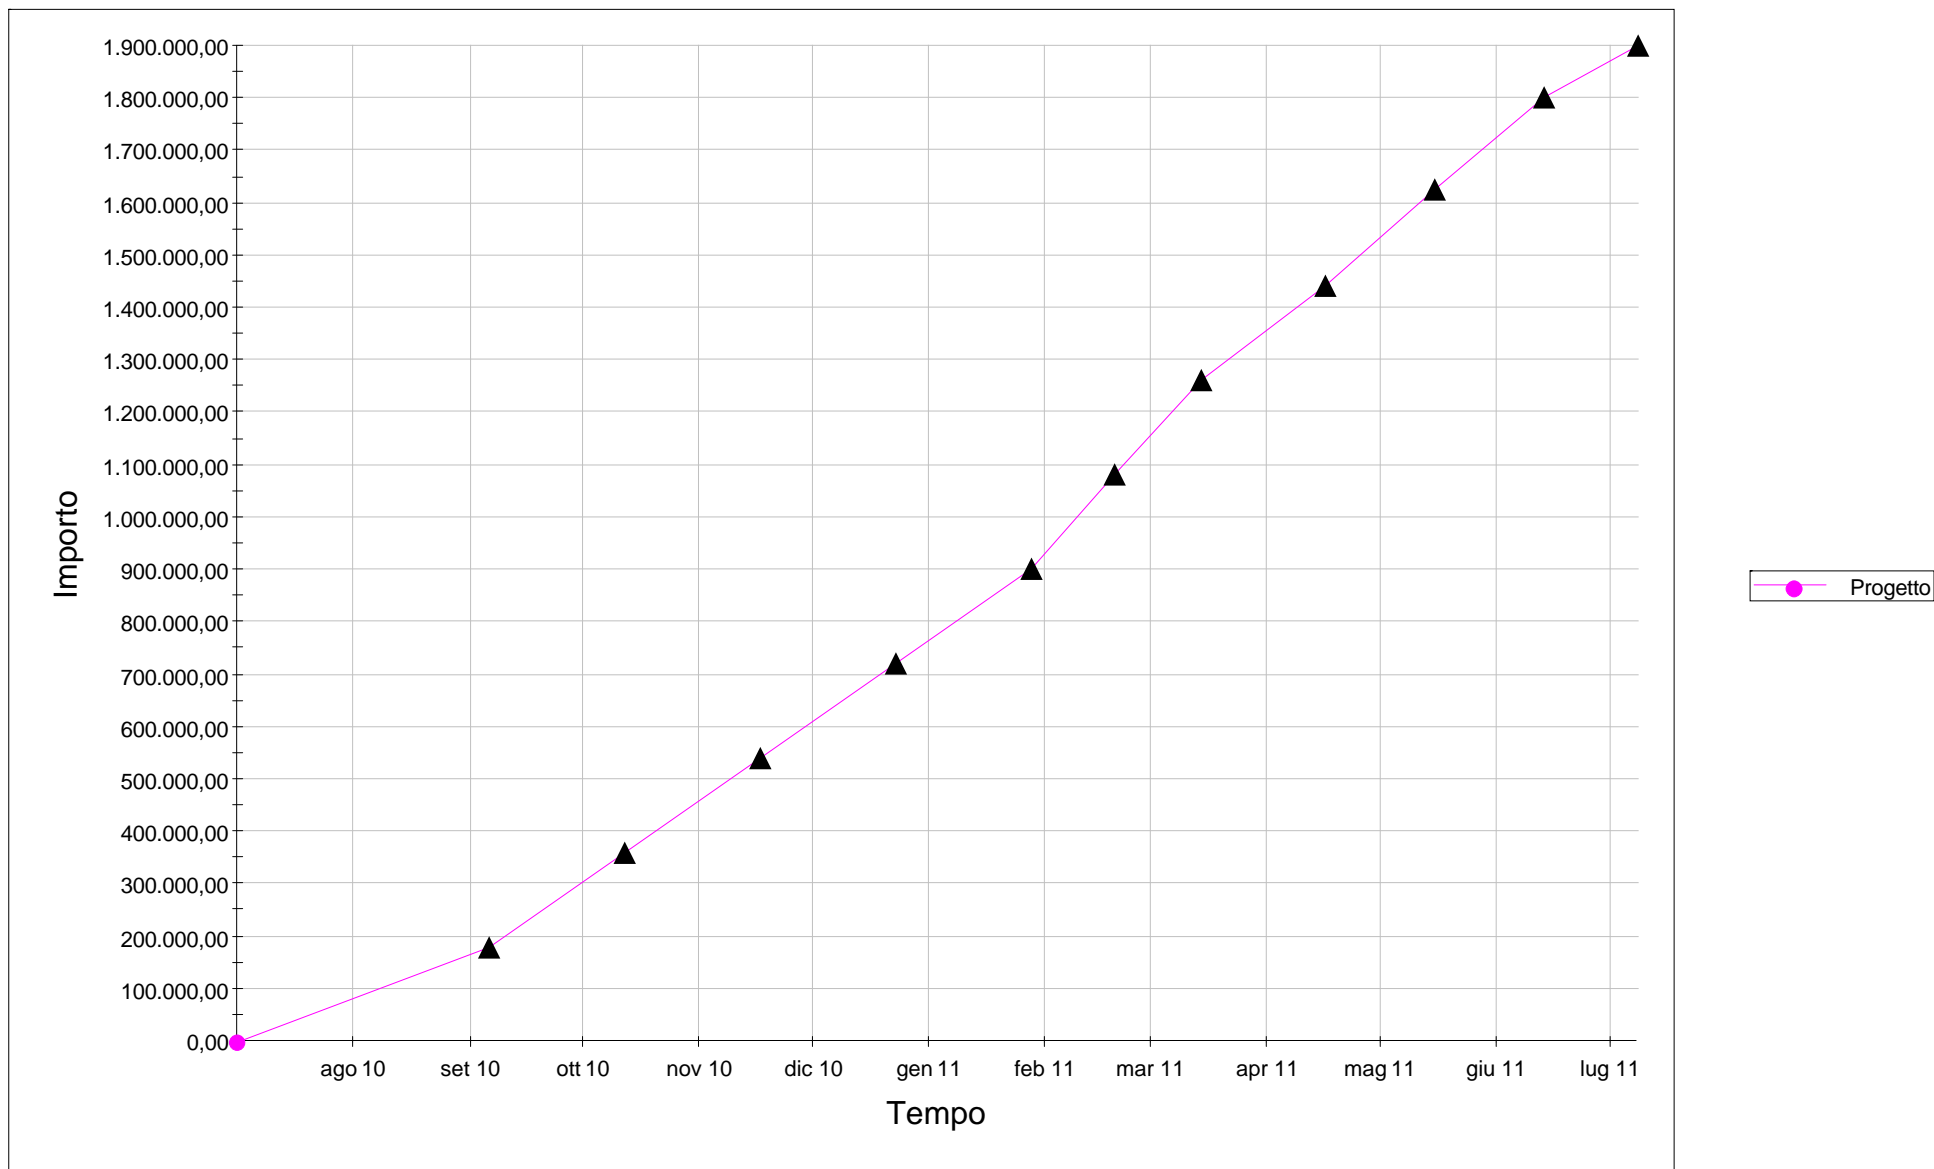

LEGENDA: ▲ Stato Avanzamento Lavori programmato
